

D O D A T E K Č . 2

ke smlouvě o dílo reg. č. SML/043/2022

na provedení stavby

Odstranění části objektu na p.č. 1434 k.ú. Ostrov nad Ohří

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Město Ostrov
Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Ing. Janem Burešem, DBA - starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 19-920341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš DBA, starosta města
b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy
Eva Holá, referent odboru městských investic a správy
c) technický dozor objednatele
(dále jen „TDO“): Ing. Roman Havlan

a

Zhotovitel: Bones s.r.o.
Se sídlem: Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10
Zastoupený: Martinem Hofmanem, jednatelem
IČO: 27936333
DIČ: CZ27936333
Bankovní spojení: Sberbank
Číslo účtu: 4211103462/6800
Telefon, fax: 728639208
E-mail: hofman@bonescb.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodli na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/043/2022 . Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

I.

Čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla se z důvodu dodatečných stavebních prací, které dne 23.05.2022 svým usnesením Č. 445/2022 odsouhlasila Rada města, navyšuje o 68 411,95 Kč včetně DPH a mění se následovně:

Cena díla bez DPH	949 151,48 Kč
DPH 21%	199 321,81 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 148 473,29 Kč

Slovy: Jeden milion jedno sto čtyřicet osm tisíc čtyřistasedmdesát tři korun a sedm set devět a čtyřicet haléřů českých

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne:

za Objednatele
Ing. Jan Bureš, DBA
starosta města

za Zhotovitele
Martin Hofman
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Specifikace:

ZMĚNA VÝŠKY A DÉLKY OPLOCENÍ, DOPLNĚNÍ STÍNÍCÍ SÍTĚ

Název stavby:

ODSTRANĚNÍ ČÁSTI OBJEKTU NA P.Č. 1434 K.Ú. OSTROV NAD OHŘÍ

Objednatel:

MĚSTO OSTROV

Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

IČ: 00254843

DIČ: CZ00254843

Zhotovitel:

Bones, s.r.o.

Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10

IČO: 27936333

DIČ: CZ27936333

Technický dozor
objednatele:

Ing. Roman Havlan

Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov


IČ: 72256583

Specifikace a odůvodnění změny:

Na základě požadavku objednatele bude provedena změna v trase a výšce oplocení a doplněna stínící síť .


Projektová dokumentace předpokládala oplocení z 3D poplastovaných panelů výšky 1m. Objednatel je vyžadován 3D poplastovaný panel výšky 2m, který bude doplněn stínící sítí se stíněním min. 90%.

Délka oplocení bude doplněno na p.p.č. 768/37, aby byl uzavřen vstup do areálu po demolici části objektu st.p.č. 1434. Oplocení bude prodlouženo o 9m

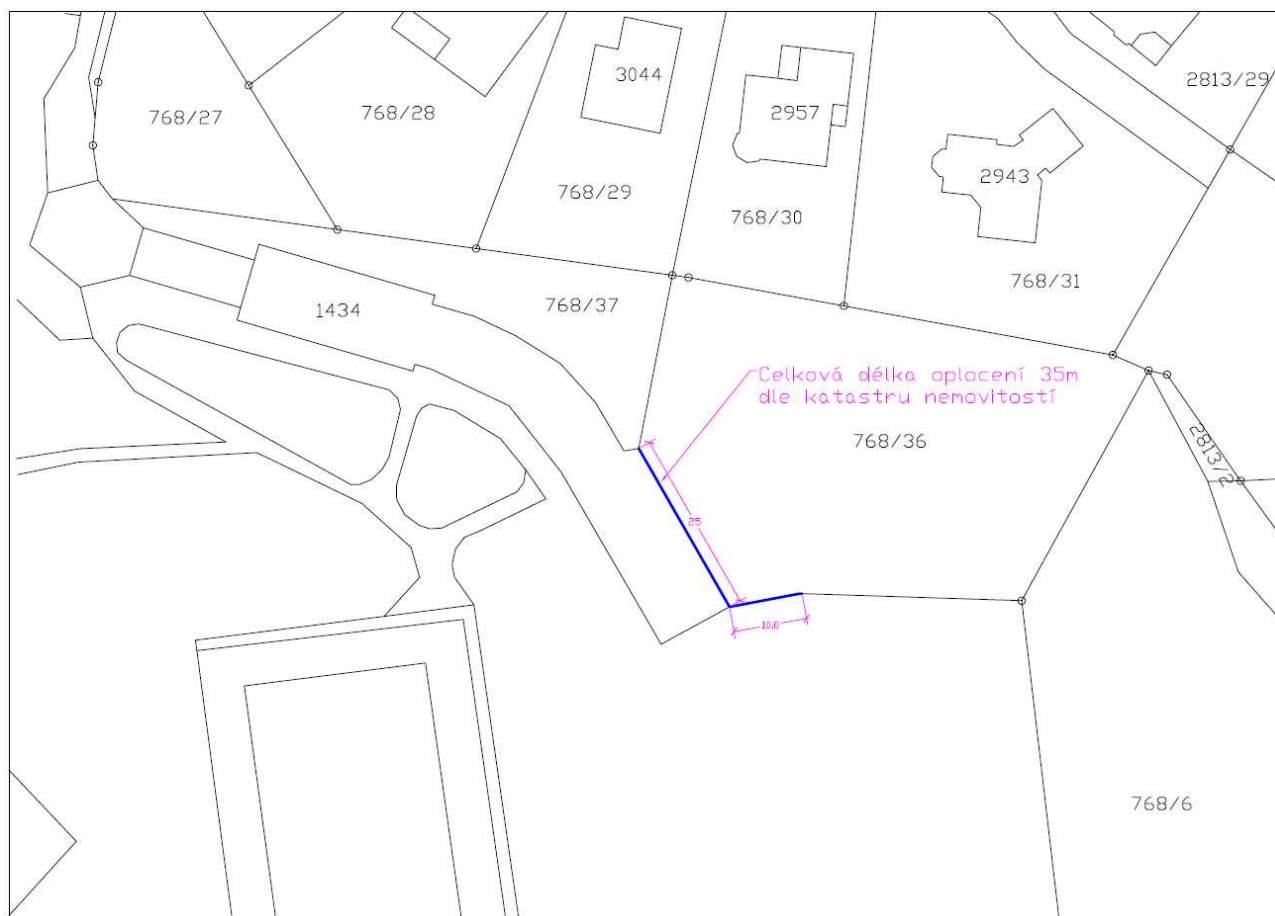Situace původního stavu

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Situace nového stavu

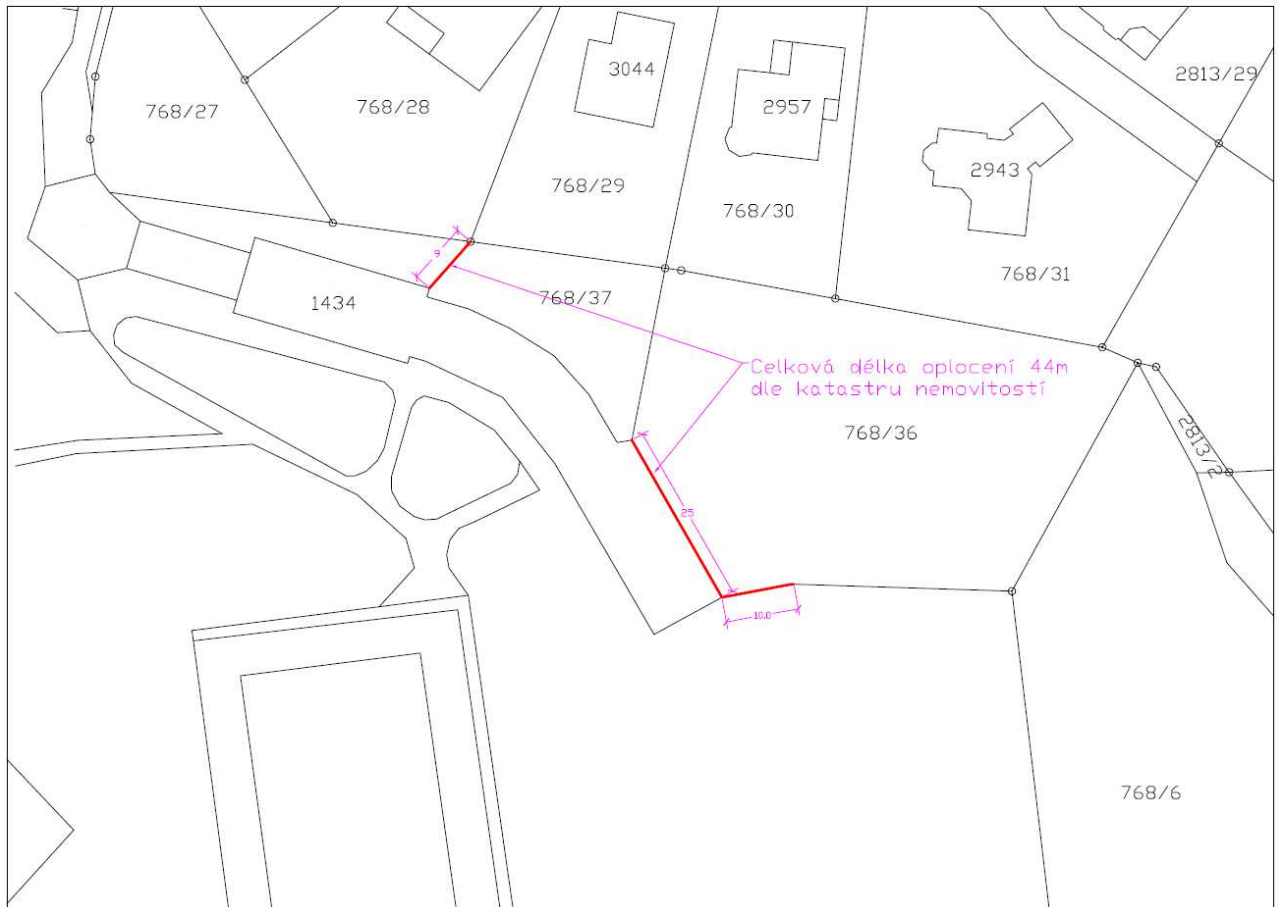

ZMĚNOVÝ LIST č. 1**Rekapitulace změnového listu:**

Popis	Celková cena bez DPH
Změna výšky a délky oplocení, doplnění stínící sítě	56 538,80 Kč
Celkem	56 538,80 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Popis	Celková cena bez DPH	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 892.612,68,-Kč bez DPH
Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	892 612,68 Kč	
<i>Vícepráce od zahájení stavby celkem</i>	<i>117 380,80 Kč</i>	<i>0,34%</i>
<i>Méněpráce od zahájení stavby celkem</i>	<i>-60 842,00 Kč</i>	<i>0,17%</i>
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	56 538,80 Kč	
Celkem	949 151,48 Kč	0,51%

Objednatel:

Ing. Jan Bureš, DBA starosta _____

Hana Špičková vedoucí odboru městských investic a správy _____

Lenka Kostaňuková investiční referent odboru městských investic a správy _____

Ing. Roman Havlan technický dozor objednatele _____

Projektant:

Ing. Milan Vítek projektant _____

Zhotovitel:

Martin Hofman jednatel _____

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 01Název stavby: **ODSTRANĚNÍ ČÁSTI OBJEKTU NA P.Č. 1434 K.Ú. OSTROV NAD OHŘÍ**

Obidnatel: MĚSTO OSTROV; Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov; IČ: 00254843; DIČ: CZ00254843

Zhotovitel: Bones, s.r.o.; Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10; IČO: 27936333; DIČ: CZ27936333

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 892.612,68,- Kč bez DPH
-------------	---------------------	----	----------	----------	----------	--

Celkem					56 538,80	
Vícepráce					117 380,80	13,15%
Méněpráce					-60 842,00	-6,82%

Změnový list č. 01 - Změna výšky a délky oplocení, doplnění stínící sítě						56 538,80
338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	-26,00	334,00	-8 684,00	-0,97%
55342152	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	-20,00	772,00	-15 440,00	-1,73%
55342188	plotová profilovaná vzpěra D 30-40mm dl 1,5-2,0m bez hlavy a objímky pro svařované pletivo v návíně povrchová úprava Pz a komaxit	kus	-6,00	258,00	-1 548,00	-0,17%
348121121	Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, při rozměru desek 300x50x2000 mm	kus	5,00	427,00	2 135,00	0,24%
59232540	betonová podhrabová deska 2000x300x30 mm se zámkem 25 mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 70x100mm	kus	5,00	879,00	4 395,00	0,49%
348171110	Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky do 1,0 m	m	-35,00	110,00	-3 850,00	-0,43%
55342411	plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	-18,00	1 740,00	-31 320,00	-3,51%
338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	33,00	340,00	11 220,00	1,26%
55342153	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	25,00	964,00	24 100,00	2,70%
55342189	plotová profilovaná vzpěra D 30-40mm dl 2,0-2,5m bez hlavy a objímky pro svařované pletivo v návíně povrchová úprava Pz a komaxit	kus	8,00	482,00	3 856,00	0,43%
348171149	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 2,0 do 2,5 m	m	44,00	275,00	12 100,00	1,36%

ODSTRANĚNÍ ČÁSTI OBJEKTU NA P.Č. 1434 K.Ú. OSTROV NAD OHŘÍ

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]	Hodnota změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 892.612,68,- Kč bez DPH
55342413	plotový panel svařovaný v 2,0-2,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	23,00	2 410,00	55 430,00	6,21%
34840123R	Montáž stínící tkaniny pro oplocení v přes 1,6 do 2,0 m	m	44,00	36,00	1 584,00	0,18%
6312726R	tkanina stínící 180g/m2 (stínění min 90%)	m2	44,00	58,20	2 560,80	0,29%
